工事名　豊橋市斎場整備・運営事業

月間工程表

令和　2年　5月　1日

徳倉建設・オーテック・藤城建設・一幸建設・豊橋建設工業JV
～　令和　2年　5月31日

5月
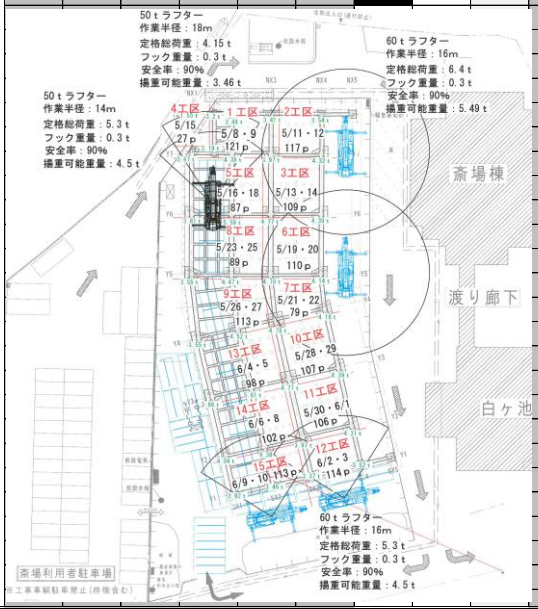
	1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木	29 金	30 土	31 日
搬入出																															
＜鉄骨工事＞																															
鉄骨建方								1工区			2工区		3工区		4工区	5工区			6工区		7工区		8工区			9工区		10工区		11工区	
建起こし											1工区		2工区		4工区	3工区			5工区		6工区		7工区			8工区		9工区		10工区	
本締め												1工区		2工区	4工区	2工区		3工区		5工区		6工区			7工区		8工区		9工区		
デッキプレート	春季休暇													1工区		2工区			3工区		4工区	5工区			6工区		7工区		8工区		
スタッド			4/29～5/6																		4工区				1,2,3,5工区						
＜仮設工事＞																															
墨出し							墨出																								
外部足場														北西鉄骨合番足場							外部足場(北側)										
																					材料搬入(外部から)										
＜2階＞ 鉄筋工事																										鉄筋材搬入(一部)					
＜3階＞ 鉄筋工事																											鉄筋材搬入				
点検、調査																															
検査関係																															
			友引 憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日			友引						友引						友引						友引
